ALLEGATO "A"

Comune di MATERA
Provincia di MT

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO:	LAVORI DI COSTRUZIONE DEL II° LOTTO - XVII GRUPPO DI LOCULI AL CIMITERO IN CONTRADA PANTANELLO
COMMITTENTE:	COMUNE DI MATERA.
CANTIERE:	Contrada Pantanello - Cimitero Comunale, MATERA (MT)

MATERA, 05/01/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____
(Geometra RIZZI Pietro Vincenzo)

per presa visione


IL COMMITTENTE

_____
(Dirigente OLIVERI Ignazio)

Geometra RIZZI Pietro Vincenzo
SETTORE TECNICO OO.PP. - Via Aldo Moro
75100 MATERA (MT)
Tel.: 0835/2411 - Fax: 0835/2411
E-Mail: rizzi.llpp@comune.mt.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

Nome attività	Durata
Allestimento cantiere	35 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e	2 g
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	5 g
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g
Montaggio del ponteggio metallico fisso	15 g
Scavi, rinterri e demolizioni	72 g
Scavo a sezione obbligata	15 g
Rinterro di scavo	4 g
Risezionamento del profilo del terreno	9 g
Opere strutturali	30 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazi	5 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	5 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	5 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazic	5 g
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	5 g
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a.	5 g
Realizzazione di solaio in c.a. in opera	5 g
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	5 g
Opere edili in genere	29 g
Montaggio di loculi cimiteriali prefabbricati in c.a.	15 g
Formazione di massetti	9 g
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	3 g
Formazione di massetto per coperture	6 g
Impermeabilizzazione di coperture	12 g
Opere di finitura	57 g
Posa di pavimenti per esterni	25 g
Posa di rivestimenti esterni in marmo	12 g
Posa di ringhiere e parapetti	8 g
Tinteggiatura di superfici esterne	10 g
Impianti	72 g
Realizzazione di impianto elettrico	4 g
Posa di conduttura elettrica	6 g
Posa di conduttura idrica	3 g
Posa di collettore fognario	8 g

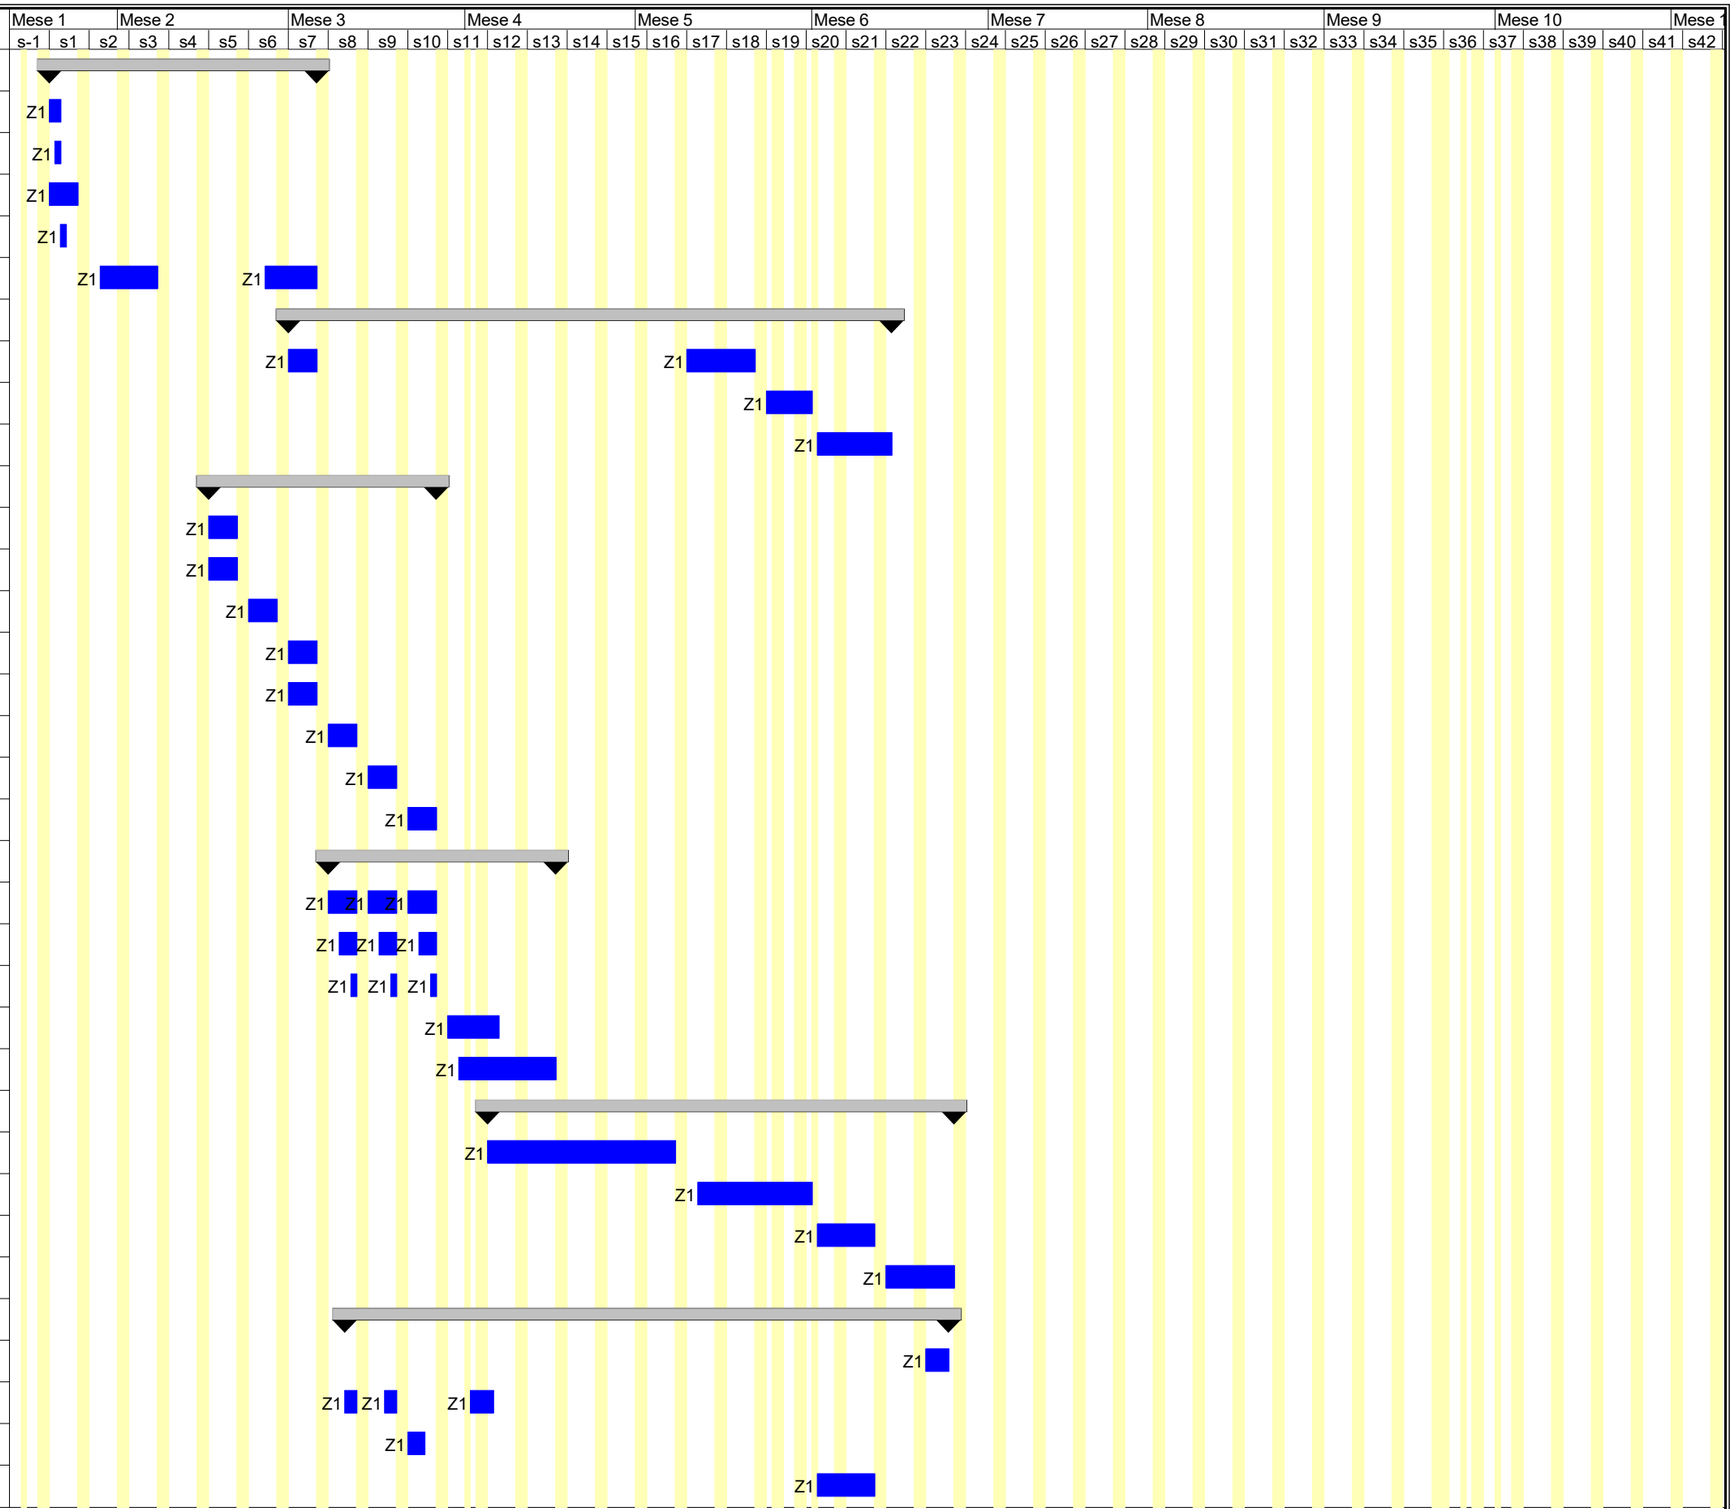

Nome attività	Durata
Realizzazione di impianto idrico-sanitario	5 g
Smobilizzo cantiere	13 g
Smontaggio del ponteggio metallico fisso	6 g
Smobilizzo del cantiere	3 g
Pulizia generale dell'area di cantiere	1 g
LEGENDA Zona:	
Z1 = ZONA UNICA	

